



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



GIUBILEO 2025 PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 83

Apertura accessi lato Marconi della stazione Roma Trastevere

Amministrazione proponente: RFI

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: J11G22000080001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
8.000.000,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
		Contratto di Programma RFI-MIT Parte Investimenti

Soggetto attuatore

RFI

Tipologia di intervento

Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale 0,00%



Descrizione

RFI sta sviluppando un progetto di apertura del secondo fronte della stazione di Trastevere. L'opera è intesa come una prima fase all'interno di un più ambizioso progetto di realizzazione di un secondo fronte di stazione con una piazza ipogea ed un parco lineare.


L'opera di prima fase prevede:

- Riapertura e prolungamento del secondo sottopasso di stazione fino al quarto marciapiede;
- Realizzazione di un ingresso carrabile e pedonale da via del Fornetto;
- Riqualificazione della scala esistente su via Portuense per consentire un ulteriore accesso.



Tale configurazione progettuale è impostata in modo da costituire un upgrading della stazione in previsione del Giubileo, è in corso la progettazione che terminerà nel corso del 2023.

La fine lavori é prevista alla fine del 2025.

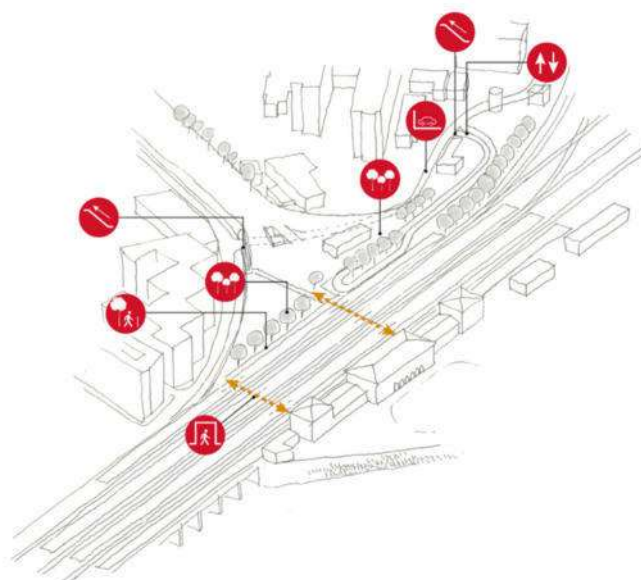

Intervento n. 83 - Apertura accessi lato Marconi della stazione Roma Trastevere



Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
8,0	0,00	0,5	3,5	4,0	0,00

Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
Attività successive alla pubblicazione del DPCM		
I/2023	PFTE + PD	Progetto Definitivo
II/2023	PFTE + PD + iter autorizzatorio ed attività propedeutiche	Progetto Definitivo + Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Affidamento Progettazione Esecutiva e Lavori	Stipula contratto
IV/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Esecuzione	SAL
II/2025	Esecuzione	SAL
III/2025	Esecuzione	SAL
IV/2025	Realizza Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo

